

E. 木作展示櫃工程施工抽查紀錄表

編號：DF97-5-SC-E-1

工程名稱	東勢林業文化園區禮堂整修為遊客中心暨設施改善工程		
分項工程名稱			
檢查位置		檢查日期	115. 5. 20
施工結果	☐ 施工前 ☒ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
抽查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
材料規格尺寸	需與送審核定資料比對一致 合板厚度 國產柳杉厚度 角材尺寸	木心板厚度 1.8 cm	○
位置/範圍確認	依圖說 A11-05~A11-26 規定。 A：L 型固定式木作展示櫃、B：L 型固定式木作展示櫃、C：L 型固定式休息區木作櫃體、D：L 型固定式休息區木作櫃體、F：固定式賣店木作陳列架、G：固定式賣店木作陳列架、H：固定式服務台木作櫃台、I：固定式服務台木作背板、J：固定式鋼構木作屋頂、K：固定式木作舞台扶手與展示架	B=L 型木作 展示櫃 依圖 A11-09	○
設置位置放樣	依圖說 A11-05~A11-26 規定。	高度 90 cm	○
木作設施物尺寸 (含五金配件)	依圖說 A11-05~A11-26 規定	櫃體內長 126 cm	○
表面處理方式	依圖說 A11-05~A11-26 規定 刷漆一底二度		
環境整理	施工後廢棄物需清理乾淨		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片） ☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。			

監造工地負責（授權）人：

王修文

監造現場人員簽名：

李龍廷

農業部林業及自然保育署臺中分署

施工抽查照片

工程名稱：東勢林業文化園區禮堂整修為遊客中心暨設施改善工程


第1頁 共1頁




木心板厚度 18mm




B木作展示櫃高度 90cm

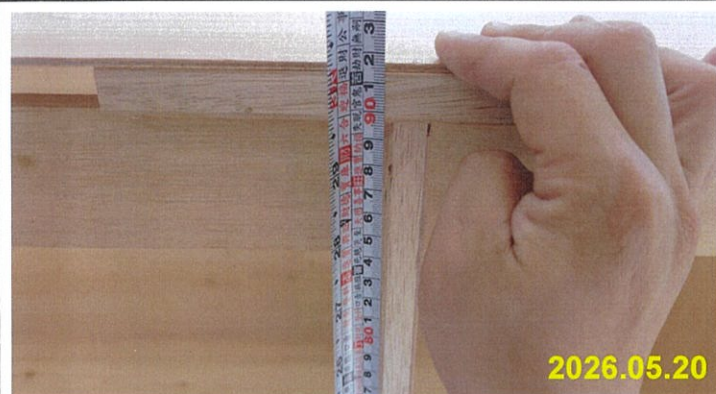

B木作展示櫃高度 90cm

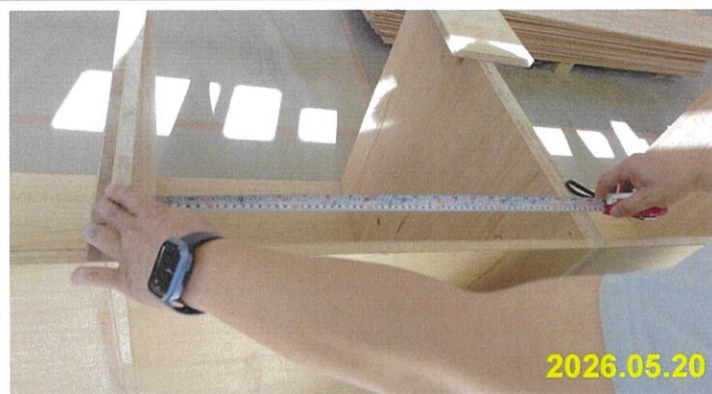

B木作展示櫃內部長度 126cm

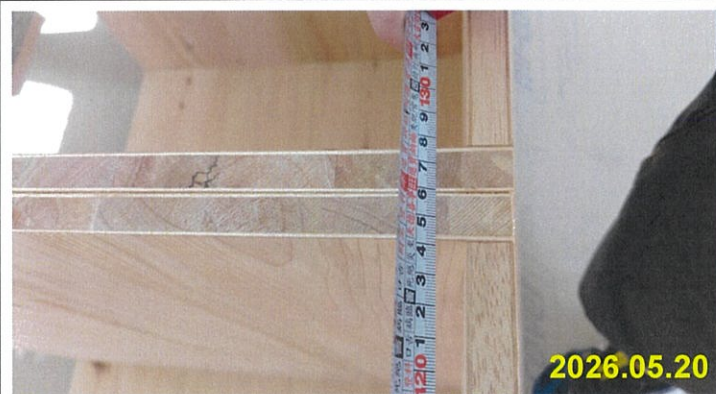

B木作展示櫃內部長度 126cm



現場木作工作環境

E. 木作展示櫃工程施工抽查紀錄表

編號：DF97-5-SC-E-2

工程名稱	東勢林業文化園區禮堂整修為遊客中心暨設施改善工程		
分項工程名稱			
檢查位置		檢查日期	115. 6. 15
施工結果	☐ 施工前 ☒ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
抽查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
材料規格尺寸	需與送審核定資料比對一致 合板厚度 國產柳杉厚度 角材尺寸		
位置/範圍確認	依圖說 A11-05~A11-26 規定。 A：L 型固定式木作展示櫃、B：L 型固定式木作展示櫃、C：L 型固定式休息區木作櫃體、D：L 型固定式休息區木作櫃體、F：固定式賣店木作陳列架、G：固定式賣店木作陳列架、H：固定式服務台木作櫃台、I：固定式服務台木作背板、J：固定式鋼構木作屋頂、K：固定式木作舞台扶手與展示架	K 舞台展示架 (圖 A11-26)	○
設置位置放樣	依圖說 A11-05~A11-26 規定。	高度 110cm	○
木作設施物尺寸 (含五金配件)	依圖說 A11-05~A11-26 規定		
表面處理方式	依圖說 A11-05~A11-26 規定 刷漆一底二度	表面貼紙	○
環境整理	施工後廢棄物需清理乾淨	櫃體內有木屑	×
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☒ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期：115 年 6 月 29 日 複查人員職稱：監造工程師 簽名：林紀廷		櫃體表面有破角 ×	
備註：			
1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確 (例：磚砌完成後須不透光) 或量化尺寸 (例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。			

監造工地負責 (授權) 人：

監造現場人員簽名：

王修文

林紀廷

農業部林業及自然保育署臺中分署

施工抽查照片

工程名稱：東勢林業文化園區禮堂整修為遊客中心暨設施改善工程

第1頁 共1頁

	
K舞台展示架構架量測	K舞台展示架構架量測
	
C木作櫃體施工後	
